



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Ny videregående skole i Holmestrand kommune

Forstudie

Orientering i rådene

Måns Davidson 3. juni 2024





Formål

«Ny videregående skole i Holmestrand kommune» skal ha en profil som vil bidra til at skolen fremstår som et godt og fremtidsrettet utdanningsvalg for elevene, men også spiller sammen med nærmiljø, nærings- og arbeidsliv og svarer på samfunnets behov for kompetanse.

En samlokalisert vgs i Holmestrand kommune skal forankres lokalt og i samråd med lokale krefter for at skolen skal fremstå som en møteplass og utviklingskraft i lokalsamfunnet.



Om prosjektet

- Prosjektet er en oppfølging av vedtak i fylkestingssak 165/21 og 103/18, om skolestruktur i nordre Vestfold, vedtak i orienteringssak 41/22 i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, og vedtak i sak 15/24 i fylkestinget i Vestfold fylkeskommune.
- Prosjektmandatet for forstudie-fasen er vedtatt i Fylkesdirektørens ledermøte 15. april 2024.
- Prosjektplanen for forstudie-fasen skal vedtas i styringsgruppen juni 2024.





Om prosjektet


Vedtakstekst fra fylkestings sak i februar 2024

1. Rapport om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold tas til orientering.
2. I tillegg til de to foreslåtte alternativene **utredes også tomten i Prestegårdsalleen i Sande** (gamle rådhus tomten).
3. **Prosjektleder/ fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå samspillsavtale for fase 1 med en entreprenør, etter konkurranse, for å gjennomføre et forprosjekt og beregne total kostnader for de tre alternativene.**
4. **Fylkesdirektøren bes komme tilbake med sak som belyser fordeler og ulemper og økonomisk risiko ved bruk av samspillavtale kontra totalentreprise for fase 2 av de tre prosjektene.**
5. **Fylkesdirektøren bes også vurdere muligheter for offentlig/privat samarbeid om ny skole i nordre Vestfold.**
6. Forprosjektet skal sikre en realistisk kostnadsramme, gi grunnlag for en hensiktsmessig lokalisering av skole og hensynta regionale klimamål og bærekraftig arealpolitikk.
7. Det innarbeides 5 millioner kroner til forprosjekt i budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.
8. Administrasjonen **bes utarbeide en plan som slår fast hvordan elever og ansatte** skal sikres trygghet og forutsigbarhet i overgangsfasen og helt frem til en samlokalisering er gjennomført. Dette må vedtas samtidig som valg av lokalisering foretas.
9. Fremover skal det sikres **meget god involvering fra ansatte og elever** fra begge dagens skoler.







Lokasjonsalternativene

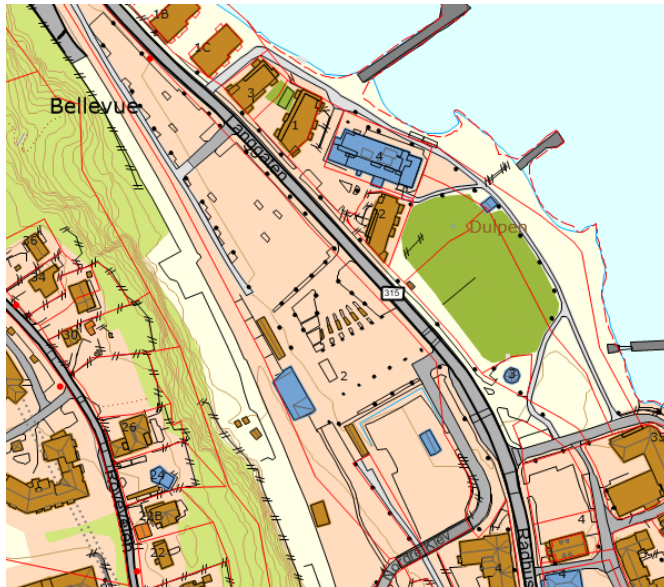

Holmestrand sentrum - Nordbyen

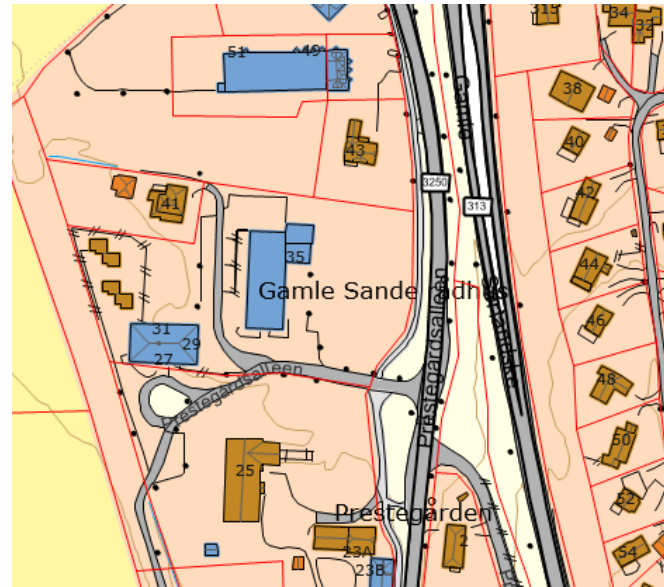

Gamle rådhusomtten i Sande (nytt alternativ)

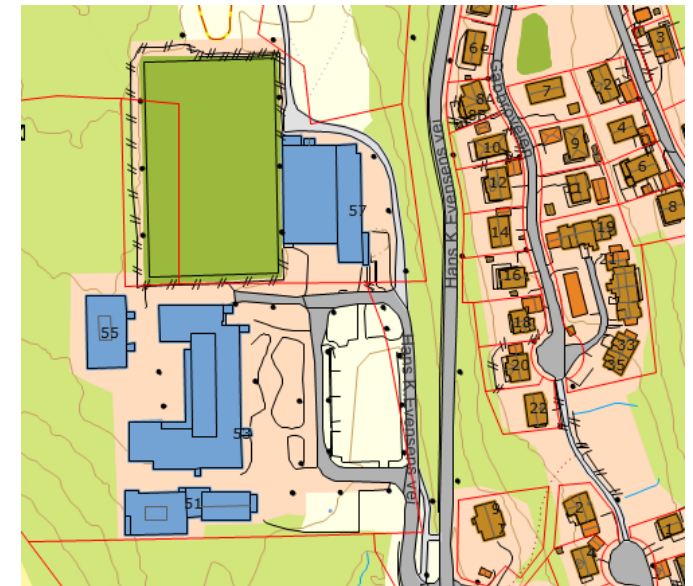

Eksisterende Sande VGS

Mulighetsstudien som ble lagt frem i fylkestinget i februar 2024 viser mulige løsninger for ny skole på tomtene.



Økonomi

- 5 millioner kroner i budsjettet for 2024
- Foreløpig økonomisk ramme for prosjektet
 - 900 millioner kroner (2024-kroner)
 - Inkludert mva.
 - Ekskludert prisstigning



Foto: Visit Vestfold, Terje Aamodt





Fremdrift for prosjektet



Det er knyttet usikkerhet til sluttdatoen for prosjektet på grunn av reguleringsprosess, finansieringsmuligheter, beslutningsprosesser og samordning med kommunen.





Prosjektorganisasjon

OPPDRAGSGIVER

Fylkestinget

PROSJEKTEIER


Fylkesdirektør
Torill Eeg

PROSJEKTANSVARLIG

Økonomidirektør
Arve Semb Christophersen


PROSJEKTLEDER

Seksjonsleder Eiendom
Måns Petter Davidson

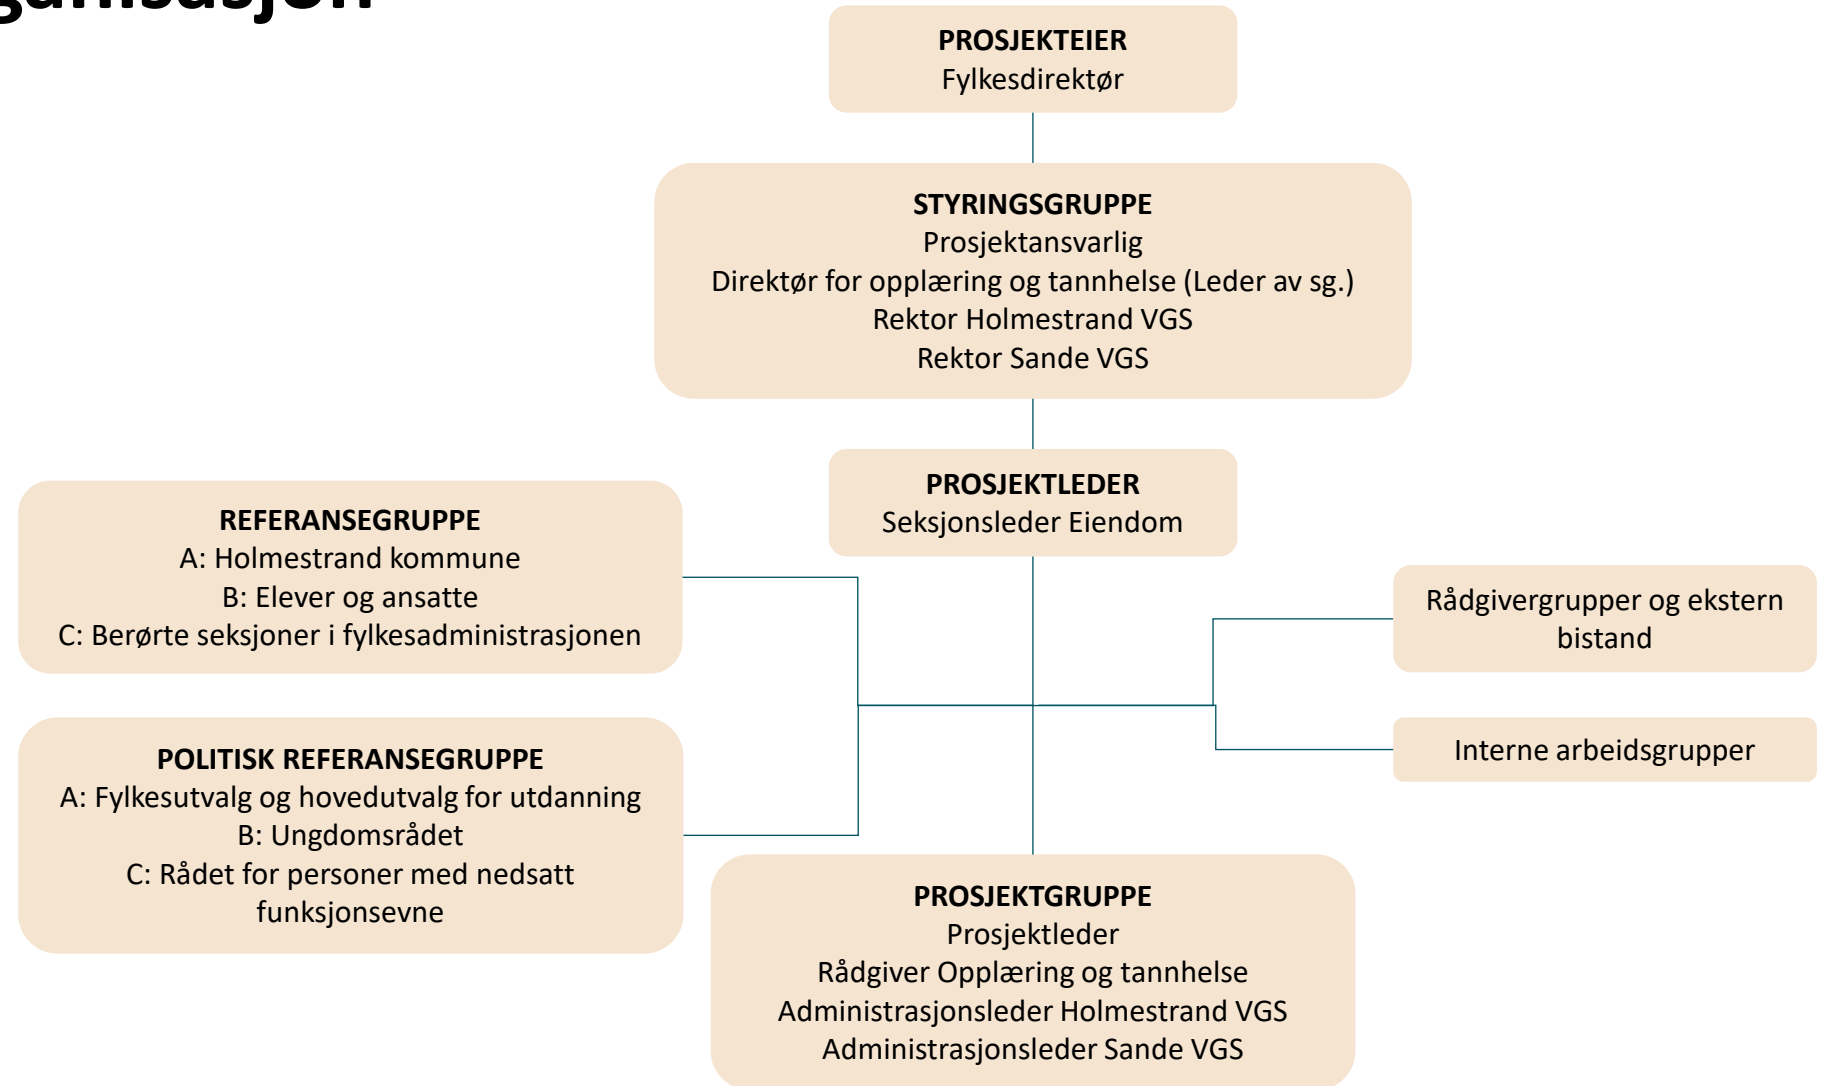



Kommunikasjon og medvirkning

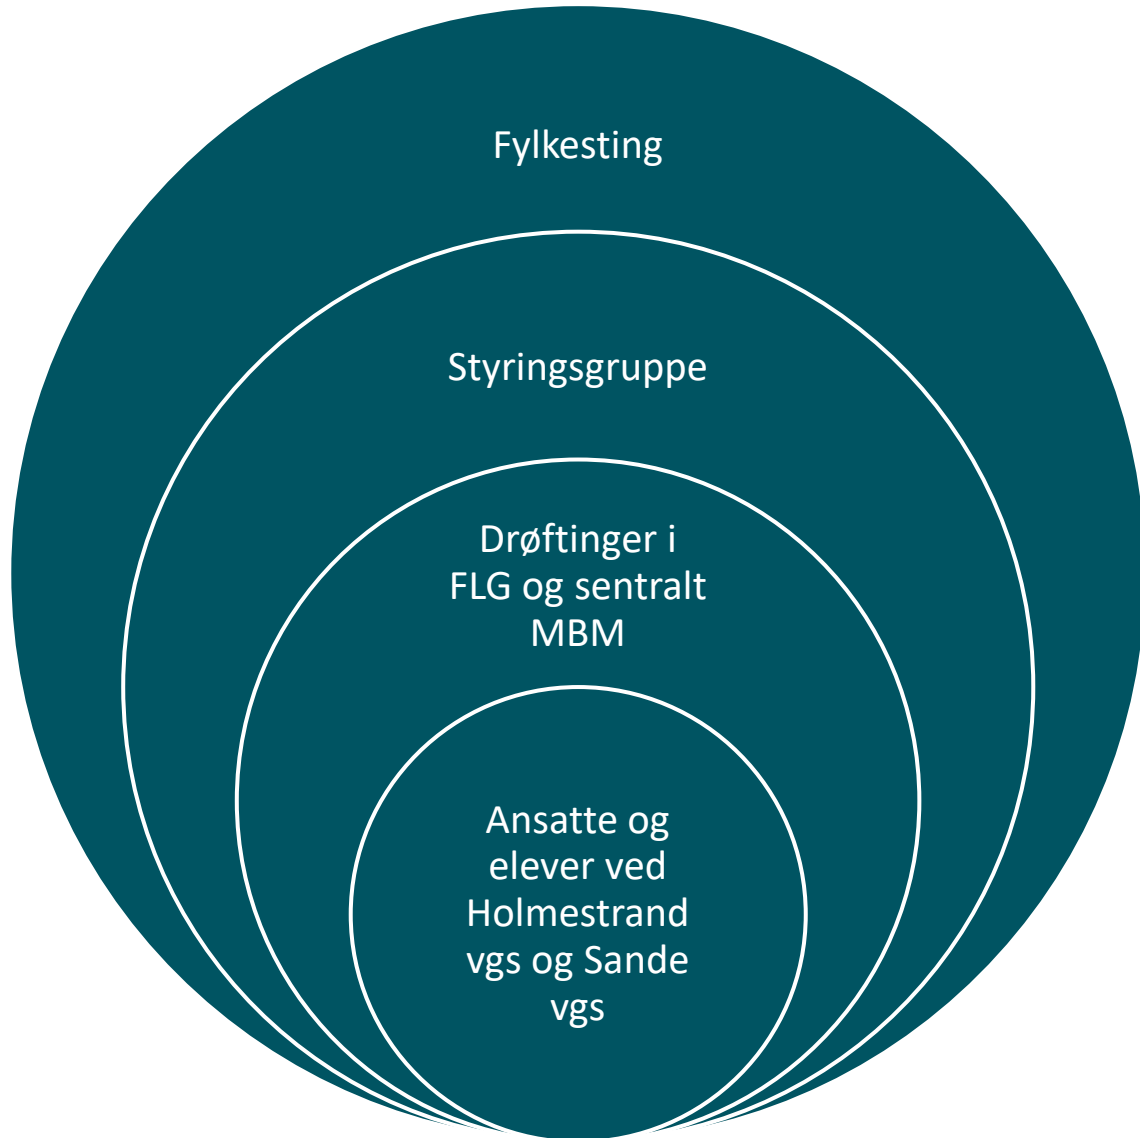

- Kommunikasjon eksternt
 - Landingside for prosjektet lanseres i slutten av juni på vestfoldfylke.no
 - Direktør for opplæring og tannhelse er kommunikasjonsansvarlig i prosjektet
 - Nøkkeldokumenter blir arkivert i Public 360
- Medvirkning
 - Visjonsbok og tilbudsstruktur er temaer for medvirkning i denne prosjektfasen.
 - Elevråd og ansatte på de to skolene informeres og involveres jevnlig og spesielt i forkant av drøftinger sentralt.
 - Medbestemmelsesmøte sentralt og lokalt – prosjektplanen drøftes 12. juni
 - HAMU
 - Referansegrupper
- Bred orientering i politiske råd og utvalg.



Medvirkning

- Fylkestinget har vedtatt at det skal være meget god involvering av ansatte og elever i prosjektet. Informasjon om byggeprosjektet foreslås derfor være fast sak på møter med de ansatte, medbestemmelsesmøter og elevrådsmøter på de to skolene. Innspill fra de ulike aktørene vil da kunne tas aktiv med inn i arbeidet i prosjektet og som grunnlag inn mot drøftinger i sentralt medbestemmelsesmøte.
 - Møter avtalt nå:
 - 4. juni: møte elevrådet Holmestrand vgs
 - 4. juni: Felles lokalt MBM med tillitsvalgte fra begge skolene
 - 4. juni: Møte alle ansatte Holmestrand vgs
 - 5. juni: Møte alle ansatte Sande vgs
 - 5. juni Møte elevrådet Sande vgs
12. Juni er det MBM sentralt
24. Juni er det styringsgruppemøte





Visjonsbok

- I løpet av høsten 2024 skal det utarbeides en Visjonsbok for den nye skolen og det skal gjøres i fellesskap.
- Konkret plan for arbeidet med Visjonsbok skal igangsettes før sommeren hvor det skal gjennomføres et møte med avdelingsledere på de to videregående skolene for å planlegge gjennomføring av prosessen – avtalt 18. juni
- Ansatte og elever vil bli involvert i august.



Foto: Wokadepix




Utdanningsprogramtilbud

- Den nye skolen i Holmestrand kommune må planlegges med et programtilbud. Programtilbudet har mange avhengigheter:
 - Innholdet i Visjonsboka
 - Prinsippsak om skoletilbud
 - Fullføringsreformen
 - Demografisk utvikling
 - Regionalt kompetansebehov
- I tillegg til mange avhengigheter er det også mange aktører som skal spille inn i arbeidet.
- Konkret plan for denne prosessen legges frem tidlig i august.





Hovedaktiviteter og milepæler i tidslinje

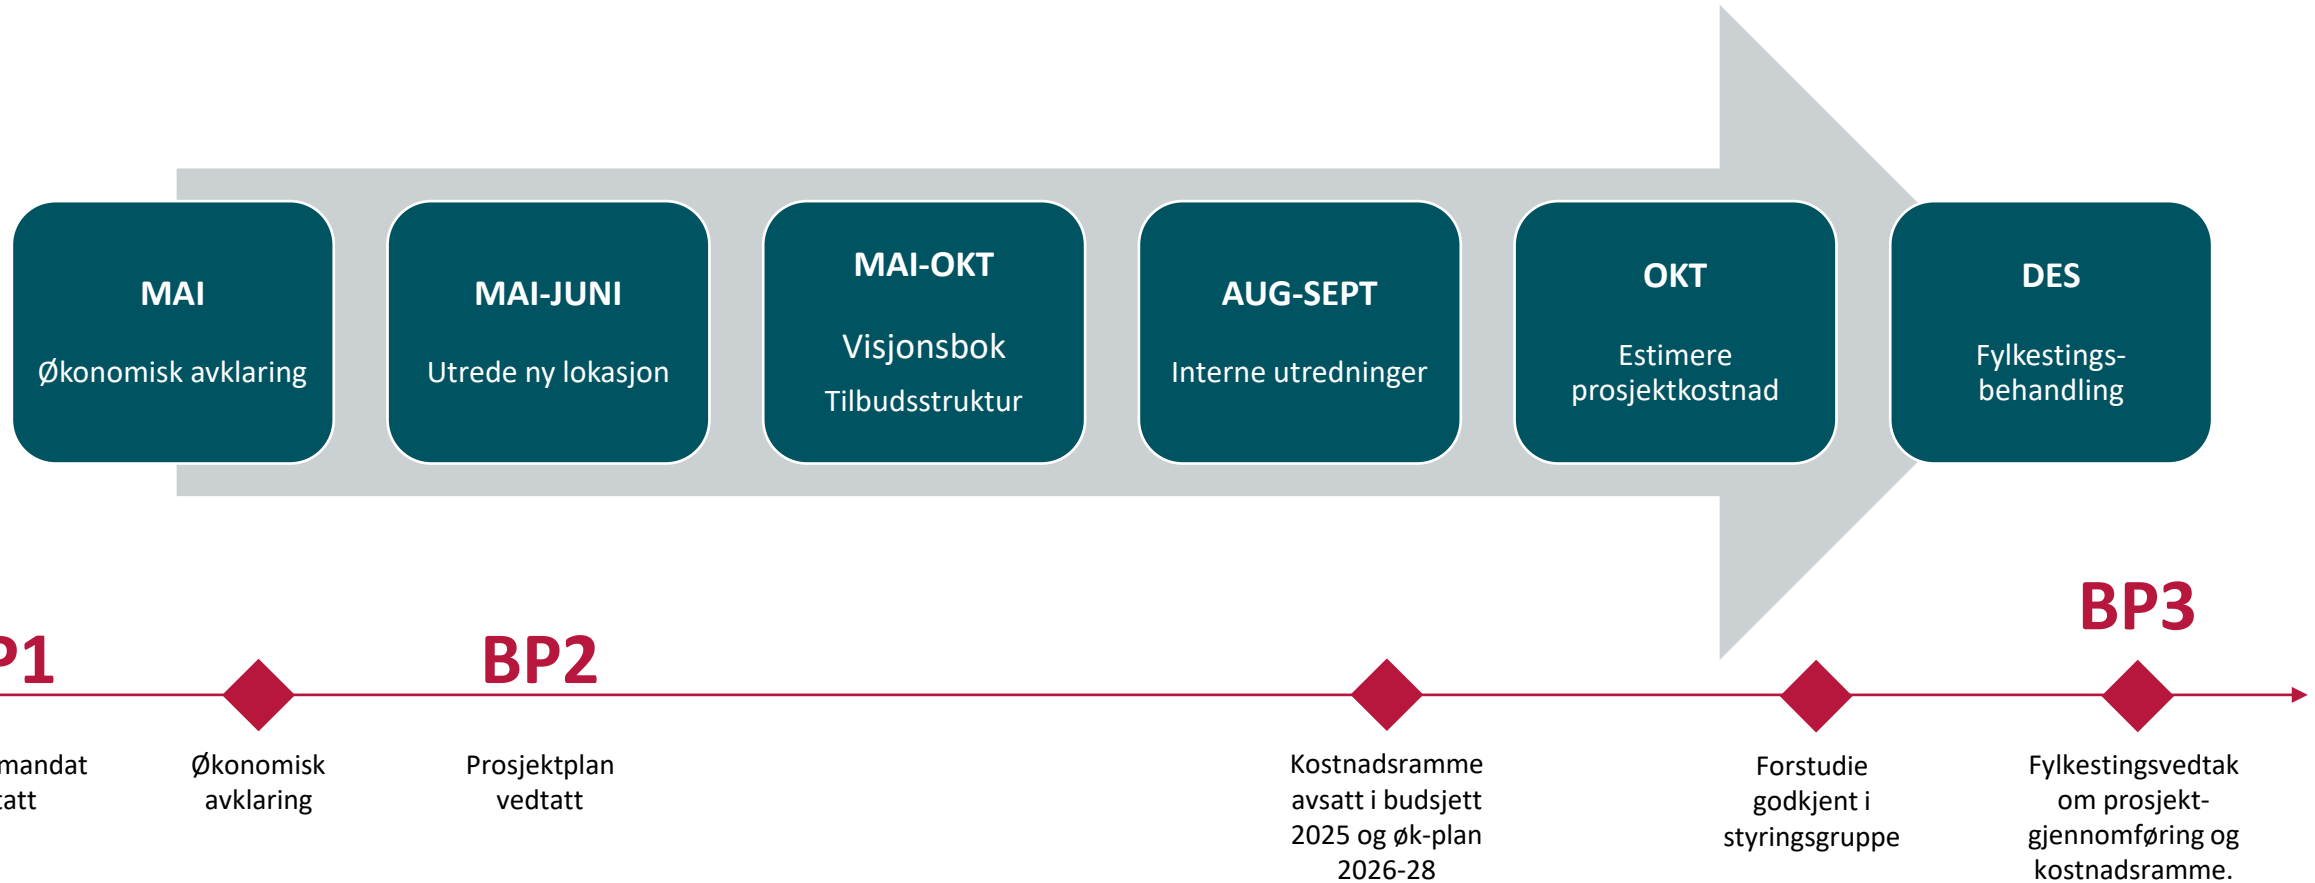




Risikofaktorer

- Fylkeskommunens økonomiske tåleevne
- Forsinkelse i fremdriften til forstudie knyttet til kompleksitet
- Beslutning om tilbudsstruktur blir ikke tatt
- Grensesnittet mot administrative og politiske prosesser mot Holmestrand kommune
- Fravær av en felles samskapt skolekultur



Neste orientering i rådene er 28. oktober

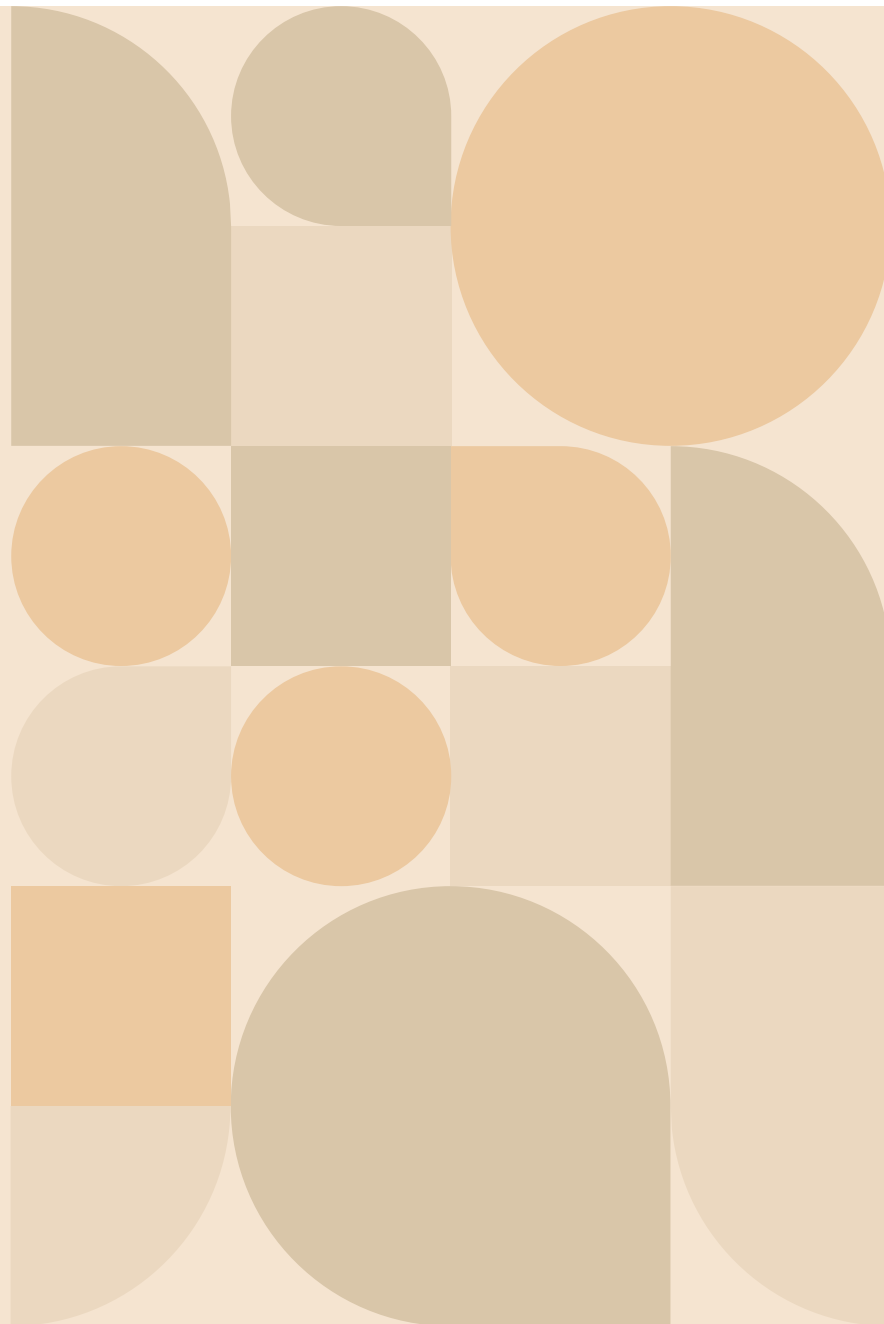



Vestfold

FYLKESKOMMUNE

vestfoldfylke.no

